

Kunde
Familie Lindner
Gartenweg 14, 70173 Beispielburg

Auftrag / Objekt
Bad Obergeschoss

Ausgeführte Arbeiten

Alte Zuleitungen am Waschtisch entfernt, neue Kupferleitung mit Pressfittings verlegt, Eckventile gesetzt.
Druckprobe ohne Befund.


Arbeitszeit

Person	Zeit	Pause	Std.
Jonas Keller	07:30 – 12:00	–	4,50
Jonas Keller	12:30 – 15:00	–	2,50
Gesamt			7,00 Std.


Material

Bezeichnung	Menge
Kupferrohr 15 mm	4,5 m
Pressfitting 15 mm	6 Stk
Eckventil verchromt	2 Stk
Dichtungsset	1 Set

Fotos

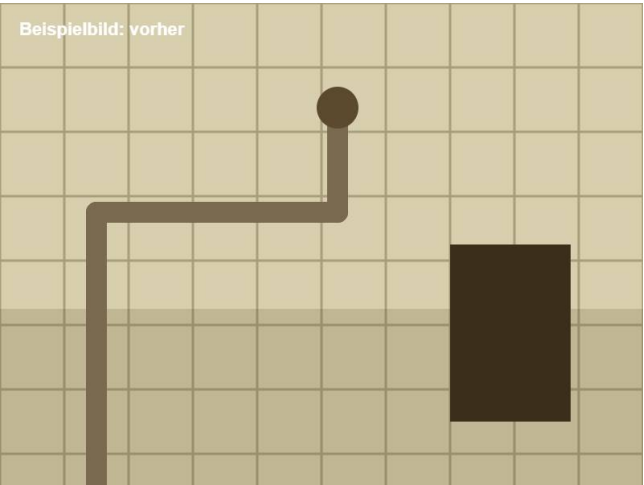

Vorher

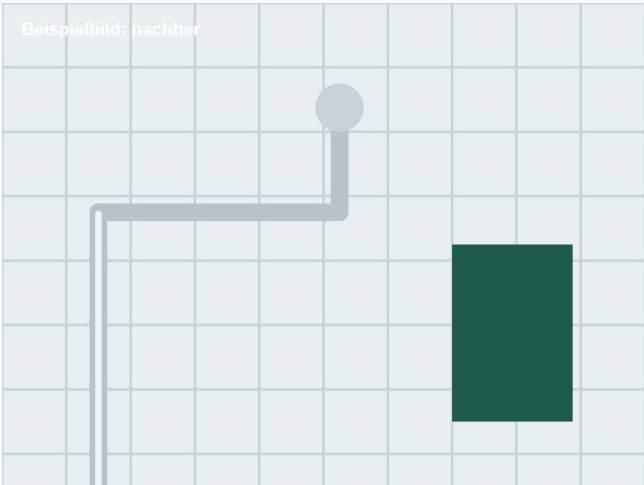

Nachher

Bestätigung durch den Kunden



S. Lindner · 16.10.2026

Der Kunde bestätigt mit seiner Unterschrift die oben genannten Arbeiten.
